



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14457 CUP F78E19000040002 Scuola secondaria di primo grado GIULIO CESARE. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio (ex finanziamento regionale DGR 511/2018). Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation UE. Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3. Approvazione Certificato di collaudo tecnico amministrativo. Atto da pubblicare.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 538 del 06/03/2025

*Determinazione (DD)* n. 491 del 10/03/2025

*Fascicolo* 2018.XI/2/1.488 "C.I. 14457 Scuola secondaria di primo grado Giulio Cesare."

*Sottofascicolo* 1 "C.I. 14457 Scuola secondaria di primo grado Giulio Cesare - delibere e determine"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Menegazzi Aldo, in data 06/03/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 07/03/2025.



P.D.D. n. 538 del 06/03/2025

Fascicolo n 2018/XI.2.1/488

**Oggetto:** C.I. 14457 CUP F78E19000040002 Scuola secondaria di primo grado GIULIO CESARE. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio (ex finanziamento regionale DGR 511/2018). Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation UE. Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3. Approvazione Certificato di collaudo tecnico amministrativo. Atto da pubblicare.

#### IL DIRIGENTE

**Visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento delle leggi sugli Enti Locali", in merito a funzioni e responsabilità dei dirigenti;

#### Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 77 del 19 dicembre 2024 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 257 in data 30 dicembre 2024 è stato approvato, altresì, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la

sottosezione “Performance”, la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, la sottosezione “Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale”, la sottosezione “Organizzazione del lavoro agile” e la sottosezione “Piano delle Azioni Positive”;

- con disposizione del Sindaco, PG n. 243550 del 18.05.2023, è stato prorogato l’incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, al dott. Aldo Menegazzi;

**Preso atto** di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.02.2013;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” e s.m.i., per le parti ancora vigenti ai sensi degli art. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.” e s.m.i.;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- il “Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 20.09.2004;
- il “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15.06.2016;
- il “Codice di comportamento interno”, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 314 del 10.10.2018, successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13.04.2023;
- lo Statuto;

- **Visti, altresì:**
- - il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- - la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 che prevede “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”;
- - il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;
- - l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- - l’Allegato 1, rev.2 -10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea relativa all’approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, ove viene espressamente previsto, per garantire l’assolvimento del principio del DNSH, il divieto di realizzazione di interventi che prevedano l’acquisto e l’installazione di caldaie a condensazione a gas;
- - la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- - l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- - il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio

2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- - il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- - il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- - i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- - gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- - le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante "Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti", che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- - la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- - la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)";
- - la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, Ufficio II, avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
- - l'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 rubricato "Revoche e controlli";

- - il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 17";
- - le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze di seguito indicate:
  - n. 32 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH);
  - n. 33 del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
  - n. 6 del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";
  - n. 21 del 29 aprile 2022, avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";
  - n. 27 del 21 giugno 2022, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";
  - n. 28 del 4 luglio 2022, avente ad oggetto "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative";
  - n. 29 del 26 luglio 2022, avente ad oggetto "Modalità di erogazione delle risorse PNRR";
  - n. 30 del 11 agosto 2022 avente ad oggetto "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori";
- **Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 22 marzo 2022 avente ad oggetto "Approvazione dello Schema di Protocollo d'intesa tra il Comune di Venezia e il Comando Provinciale Venezia della Guardia di Finanza per la collaborazione e lo scambio d'informazioni in relazione agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 comma 1, lettera d), del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii ;

- **Posto** che:
- con Delibera Giunta Regionale Veneto n. 511 del 17 aprile 2018: "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali. (L. 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018)" è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione nella graduatoria per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali con i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 15/05/2018 è stato approvato, ai fini della presentazione dell'istanza di ammissione all'Avviso Pubblico di cui sopra nei termini di scadenza dello stesso, il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di cui all'oggetto, per l'importo di € 2.500.000,00.=.
- con Delibera Giunta Regionale Veneto n. 1044 del 17.07.18 il procedimento in oggetto è stato ammesso in graduatoria in annualità 2019 e con DRGV 865 del 19.06.2019 è stato approvato il Piano aggiornato del fabbisogno per l'edilizia scolastica 2019-2020, confermando la graduatoria precedente;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 71 del 25.07.2020, è stato assegnato il contributo di € 2.500.000,00 per l'intervento di cui all'oggetto e con nota della Regione prot. n. 440952 del 16.10.2020 si comunicava l'avvenuto finanziamento con Mutui BEI 2019;
- il D.M. n. 71/20 indicava quale scadenza, pena la revoca del finanziamento, la proposta di aggiudicazione dei lavori entro il 24.09.2021;

**Dato atto che** con nota pervenuta all'Amministrazione Comunale il 18/10/2022 prot. n. 485870 veniva formalmente comunicato il passaggio a finanziamento PNRR dell'intervento in oggetto quale progetto "*in essere*" Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" e pertanto di fatto l'intervento in oggetto è rientrato tra quelli finanziati con il PNRR;

**Visto altresì** che in data 30/06/2023 è stato sottoscritto l'Atto di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori relativamente al procedimento in oggetto;

**Considerato che:**

- l'intervento in oggetto C.I. 14457 risultava inizialmente inserito, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella prima annualità del Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 e nell'Elenco Annuale 2021, del Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 18 dicembre 2020 e successive modifiche, per l'importo di € 2.500.000,00 (o.f.c.), spesa finanziata con Contributo Regionale;

- con Determina Dirigenziale n. 473 del 05/03/2021 si è proceduto ad affidare a Professionista esterno l'incarico di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione dell'intervento in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 792 del 21/04/2021 si è proceduto al parziale annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 *nonies* della Legge 241/90 della Determinazione Dirigenziale n. 473 del 05/03/2021, limitatamente alla quota parte dell'incarico relativa alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, che è stato contestualmente affidato al personale interno del Servizio Edilizia Scolastica Terraferma dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 25/05/2021, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Progetto Definitivo, dell'intervento C.I. 14457 denominato "SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GIULIO CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO" per un importo complessivo di € 2.500.000,00 (o.f.c.);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1430 del 19/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo, relativo all'intervento C.I. 14457 in oggetto, comportante una spesa complessiva di € 2.500.000,00 oneri fiscali compresi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1784 del 21/09/2021 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL, C.F.: 06231120582 e P. IVA 01514361003 (CIG 8844832A42, CUP F78E19000040002), con sede legale in Via Savoia 39/A, 00198 Roma, per un importo di € 1.407.548,48.= al netto del ribasso d'asta del 17,77% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 62.348,04.= quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 75.930,59.= per lavori in economia, per un importo contrattuale complessivo di € 1.545.827,11.=oneri fiscali esclusi, giusto contratto in data 15/11/2021, Rep. n. 22515, con un quadro economico di spesa dell'importo complessivo di € 2.128.909,07 (o.f.c.);
- con Determinazione Dirigenziale n. 665 del 25/03/2022 è stato affidato a Professionista esterno l'incarico di collaudo statico-sismico e tecnico amministrativo in corso d'opera e finale relativo all'intervento in argomento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1186 del 09/06/2022 è stato affidato a Professionista esterno l'incarico di Direzione lavori relativo all'intervento medesimo;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 14/07/2022 "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2022. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025" è stato previsto un ulteriore stanziamento dell'importo di € 126.270,00 (o.f.c.), per il riconoscimento dell'adeguamento prezzi ai sensi del D.L. 50/2022 e s.m.i., spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato da contributi Legge Speciale applicata a Bilancio 2022, a

seguito del quale il finanziamento complessivo dell'intervento è stato elevato a € 2.626.270,00 (o.f.c.)

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30/11/2022, avente ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 – Variazione" è avvenuta la presa d'atto del passaggio a finanziamento PNRR dell'intervento in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2664 del 19.12.2022, a seguito del rifinanziamento di € 126.270,00 (o.f.c.), si è proceduto al riassetamento del Quadro economico, dell'importo complessivo pari a € 2.255.179,07 (o.f.c.);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1035 del 03/05/2023 sono stati impegnati € 47.733,34 (o.f.c.) a favore dell'impresa COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL (CIG 8844832A42, CUP F78E19000040002) quale somma a disposizione per il pagamento dell'adeguamento prezzi del SAL N. 1, con riferimento al certificato di pagamento emesso dal RUP in data 30/05/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1948 del 04/09/2023 è stata approvata una Perizia di variante che non ha comportato modifica dell'importo contrattuale, ma solamente il riassetamento delle varie categorie di lavorazioni, con il seguente Quadro economico:

*Cod.Proc: 14457 Oggetto: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. (FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R. N. 511/2018)*

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	1.407.548,48	a misura	62.348,04		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	75.930,59	in economia			
<b>totale</b>	<b>1.483.479,07</b>	<b>totale</b>	<b>62.348,04</b>		
importo lavori al netto del ribasso del 17,770%		% IVA(*)		importo IVA	
1.545.827,11		22		340.081,96	

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	137.030,00			137.030,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	170.000,00			170.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	26.640,00			26.640,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	600,00			600,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	35.000,00			35.000,00
<b>totale</b>	<b>369.270,00</b>			
12) IVA			340.081,96	
<b>totale a disposizione</b>	<b>709.351,96</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>2.255.179,07</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	1.885.909,07
somme a disposizione (o.f.c.)	342.630,00
incentivi	26.640,00
<b>totale complessivo</b>	<b>2.255.179,07</b>

- con determinazione dirigenziale n. 401 del 06/03/2024 sono stati impegnati € 71.342,18 (o.f.c.) a favore della ditta COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL (CIG 8844832A42, CUP

F78E19000040002) per far fronte al all'adeguamento prezzi dei SAL n. 2, 3, 4/conto finale, senza prevedere l'impegno dello 0,5% trattenuto sul pagamento del SAL 1 AP;

- con determinazione dirigenziale n. 1614 del 8/8/2024 è stata impegnata la spesa di € 239,86 (o.f.c.) a favore della ditta COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL, importo corrispondente alla trattenuta dello 0,5% fatto sul SAL 1 AP;

**Accertato** che la spesa complessiva destinata alla realizzazione dell'intervento in argomento, dell'importo di € 2.626.270,00 (o.f.c.), è stata finanziata:

- per € 2.500.000,00 mediante Contributo Regionale PNRR messa in sicurezza edifici scolastici;
- per € 126.270,00 (o.f.c.) mediante Avanzo di amministrazione vincolato da contributi Legge Speciale applicata a Bilancio 2022, parte capitale;

**Visto** il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo dell'intervento in oggetto, emesso dal Collaudatore in data 06/06/2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da cui risulta che:

- i lavori sono stati suddivisi in due fasi, denominate "step1 lavori anno 2022" e "step2 lavori anno 2023", da eseguirsi nei mesi estivi durante la sospensione di utilizzo del plesso scolastico;
- la consegna definitiva all'Appaltatore dei lavori relativi all'annualità 2022 è avvenuta con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 18/06/2022 e sospesi con verbale del 01/09/2022, mentre la consegna definitiva dei lavori relativi all'annualità 2023 è avvenuta con verbale in data 17/06/2023. L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 08/09/2023;
- l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve;
- il Conto Finale dei lavori di cui al contratto originario è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 08/09/2023 per un importo complessivo netto dei lavori pari a € 1.540.089,51 (o.f.e.);
- è stato determinato un credito netto per l'Impresa pari a € 54.086,55 (o.f.e.);
- la contabilità finale dei lavori di cui al contratto originario ha evidenziato, altresì, una minore spesa pari a € 5.737,60 (o.f.e.) rispetto all'importo autorizzato;

**Accertato** che:

- la succitata somma di € 54.086,55 (o.f.e.), relativa al saldo lavori di cui al contratto originario risulta essere già stata interamente corrisposta all'Appaltatore;

- l'economia di spesa rispetto all'importo contrattuale pari a € 5.737,60 (o.f.e.) sopra citata risulta essere già stata contabilizzata in esercizi precedenti;

**Visto**, altresì, che nel Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo vengono riportati gli importi derivanti dall'adeguamento prezzi relativi ai SAL n. 1, 2, 3 e 4 finale, per complessivi € 97.799,50 (o.f.e.), per i quali è stato determinato un credito netto per l'Impresa pari a € 3.497,71 (o.f.e.), che risulta già interamente corrisposto all'Appaltatore;

**Accertato**, altresì, che per l'intervento in oggetto può essere posto in economia l'importo di € 426.325,76 (o.f.c.), di cui € 419.371,14 finanziati mediante Contributo Regionale PNRR messa in sicurezza edifici scolastici ed € 6.954,62 finanziati mediante Avanzo di amministrazione vincolato da contributi Legge Speciale applicata a Bilancio 2022, parte capitale, quali importi prenotati (ECON + DISP N) non più necessari;

**Dato atto che:**

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dal dott. Aldo Menegazzi, giusto provvedimento di nomina PG n. 540862 del 28/10/2019 a firma del Direttore della Direzione Lavori Pubblici;

- il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del Progetto e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. 36 del 2023 e dal dal vigente PIAO - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione esplicita del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016;

**Richiamati** i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;

**Dato atto** che il cronoprogramma finanziario dell'opera, al netto delle economie di spesa derivanti dal riaccertamento dei residui per complessivi € 9.478,01 (€ 30,00 per l'anno 2023 ed € 9.448,01 per l'anno 2024), tenuto conto dell'importo di € 26.640,00 relativo ad incentivi da reimpegnare, risulta così determinato:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>Anni precedenti</b>	<b>2025</b>	<b>Totale quadro economico</b>
Stanziato	€ 2.163.826,23	€ 452.965,76	€ 2.616.791,99
Impegnato	€ 2.163.826,23	€ 26.640,00	

**Dato atto** che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione

**DETERMINA**

1. di approvare il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo, redatto dal Collaudatore in data 06/06/2024, relativo all'intervento C.I. 14457 Scuola secondaria di primo grado GIULIO CESARE. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio, CUP F78E1900040002, allegato al presente provvedimento, dell'importo di complessivo di € 1.637.887,01 (o.f.e.), di cui € 1.540.089,51 (o.f.e.) per contabilità derivante da contratto originale ed € 97.799,50 (o.f.e.) per adeguamento prezzi relativi alle lavorazioni eseguite nel corso dell'intero appalto;
2. di porre in economia l'importo di € 426.325,76 (o.f.c.), per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate;
3. di dare atto che a seguito dell'approvazione del presente provvedimento il cronoprogramma finanziario dell'intervento risulta così aggiornato:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>Anni precedenti</b>	<b>2025</b>	<b>Totale quadro economico</b>
Stanziato	€ 2.163.826,23	€ 26.640,00	€ 2.190.466,23
Impegnato	€ 2.163.826,23	€ 26.640,00	

4. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al

presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

5. di attestare che la presente determinazione è stata adottata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013;
6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023.

La spesa complessiva finale dell'intervento ammonta a € 2.190.466,23 e risulta finanziata come segue:

- per € 2.071.150,85 al cap. 15522 art. 109 "Beni immobili", di cui € 68.516,27 a Bilancio 2021, € 1.284.605,52 a Bilancio 2022, € 599.829,17 a Bilancio 2023, € 91.559,89 a Bilancio 2024 ed € 26.640,00 a Bilancio 2025, Codice gestionale 03 "Fabbricati ad uso scolastico". Spesa finanziata mediante Contributo Regionale PNRR messa in sicurezza edifici scolastici;
- per € 119.315,38 (o.f.c.) al cap. 15522 art. 109 "Beni immobili", di cui € 47.733,34 a Bilancio 2023 ed € 71.582,04 a Bilancio 2024, Codice gestionale 03 "Fabbricati ad uso scolastico". Spesa finanziata mediante Avanzo di amministrazione vincolato da contributi Legge Speciale applicata a Bilancio 2022, parte capitale.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

### IL DIRIGENTE

dott. Aldo Menegazzi

*(atto firmato digitalmente)*

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione*

documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs. 7/3/2005 n. 82.

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 538

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 9098/2025 del 06/03/2025 "C.I. 14457 CUP F78E19000040002 Scuola  
secondaria di primo grado GIULIO CESARE.  
Interventi di adeguam"  
autorizzazione Proposta di determina 538/2025 del 06/03/2025

La prenotazione di spesa numero 9098/2025 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		<b>Prenotato</b>	<b>Impegnato</b>
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2025</b>	-6.954,62	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI		
<i>Stope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		
<i>CIG</i>	CUP F78E19000040002		
<i>Opera</i>	152 - 14457/000 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE <i>Tipo Spesa</i> DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. (FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R. N. 511/2018) - F78E19000040002		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1177 - 022.001.841.900 - AVANZO DA LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2019 - PARTE B		
	<b>Totale:</b>	<b>-6.954,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>Disponibilità:</b>		<b>-6.954,62</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 09012.02.011522109 a competenza 2025

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
<b>06/03/2025</b>	8.231,51	-6.954,62	-6.954,62	0,00	0,00	-6.954,62	<b>15.186,13</b>

COMUNE DI VENEZIA, lì 06 marzo 2025



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 9101/2025 del 06/03/2025 "C.I. 14457 CUP F78E19000040002 Scuola secondaria di primo grado GIULIO CESARE.

Interventi di adeguam"  
autorizzazione Proposta di determina 538/2025 del 06/03/2025

La prenotazione di spesa numero 9101/2025 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		<b>Prenotato</b>	<b>Impegnato</b>
<i>Capitolo</i>	04022.02.015522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2025</b>	-48.280,21	0,00
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI AUSILIARI EDUCATIVI E SCOLASTICI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		
<i>CIG</i>	CUP F78E19000040002		
<i>Opera</i>	152 - 14457/000 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. (FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R. N. 511/2018) - F78E19000040002		
<i>Tipo Spesa</i>	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1424 - 080.003.999 - CONTRIBUTO REGIONALE PNRR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI		
<i>Capitolo</i>	04022.02.015522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2025</b>	-371.090,93	0,00
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI AUSILIARI EDUCATIVI E SCOLASTICI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		
<i>CIG</i>	CUP F78E19000040002		
<i>Opera</i>	152 - 14457/000 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. (FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R. N. 511/2018) - F78E19000040002		
<i>Tipo Spesa</i>	3645 - ECON - ECONOMIE		
<i>Tipo Finanz.</i>	1424 - 080.003.999 - CONTRIBUTO REGIONALE PNRR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI		
	<b>Totale:</b>	<b>-419.371,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>Disponibilità:</b>		<b>-419.371,14</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 04022.02.015522109 a competenza 2025

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
06/03/2025	2.650.000,00	-419.371,14	-419.371,14	0,00	0,00	-419.371,14	3.069.371,14

COMUNE DI VENEZIA, lì 06 marzo 2025



REGIONE DEL VENETO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Comune di VENEZIA

**CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: Scuola secondaria di primo grado Giulio Cesare. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio (Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation UE.) -1° e 2° Stralcio

**1. PREMESSE**

COMMITTENTE E STAZIONE APPALTANTE: Comune di Venezia

PROGETTISTA: ██████████ iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova a ██████████

R.U.P.: ██████████

VALIDAZIONE: 12/07/2021

DIRETTORE DEI ██████████ iscritto all'ordine degli Ingegneri di Padova ██████████

C.S.E.: Arc ██████████, dipendente del Comune di Venezia

IMPRESA APPALTATRICE: Impresa Costruzioni ing. Enrico Pasqualucci, via B. Benvenuto 16, 30175 Marghera – Venezia;

COLLAUDATORE STATICO: ██████████ iscritto all'Ordine degli

Comune di Venezia  
Data: 19/06/2024, PG2024/0295665



Ingegneri della Città metropolitana di Venezia al n. 2851

COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO: [REDACTED]

iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Città metropolitana di Venezia al [REDACTED]

RELAZIONE STRUTTURA ULTIMATA (1° stralcio emessa in data 20/10/2022 e 2° stralcio emessa in data 20/10/2023) redatta dal direttore dei lavori in [REDACTED] - iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Padova al [REDACTED] - e acquisita in data 27/10/2023.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE: emessa in data 07/03/2024.

*La documentazione richiamata va riscontrata nella relazione sul conto finale.*

## 2. QUADRO ECONOMICO

Il progetto definitivo delle opere, redatto dall' [REDACTED] e successivamente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 25/05/2021, esecutiva a norma di legge. Il progetto esecutivo risulta approvato con determinazione dirigenziale n. 1430 del 19/07/2021, per l'importo complessivo di € 2.500.000,00 così ripartito:

### A) OPERE A BASE DI APPALTO

A1) per lavori € 1.711.721,37 soggetti a ribasso d'asta

A2) Oneri per la sicurezza € 62.348,04

A3) per opere in economia € 75.930,59

A) Totale opere a base di appalto € 1.850.000,00

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto 0,00 €

2) rilievi accertamenti ed indagini 0,00 €

3) allacciamenti a pubblici servizi 0,00 €

4) imprevisti € 10.760,00

5) acquisizione aree o immobili 0,00 €

6) accantonamento 0,00 €

7a) spese tecniche (incarichi esterni) € 170.000,00

7b) spese tecniche (incentivi) € 26.640,00

8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione 0,00 €

9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici 0,00 €

10) spese per pubblicità e opere artistiche € 600,00

11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi € 35.000,00

12) IVA € 407.000,00

B) Totale somme a disposizione dell'amministrazione comunale € 650.000,00

**TOTALE GENERALE A) + B) € 2.500.000,00**

In conseguenza dell'appalto con ribasso d'asta pari al **17.770%** sull'importo a base d'asta delle opere, il quadro economico è così stato riassestato:

**A) LAVORI DI CONTRATTO**

A1) Importo lavori di contratto (secondo offerta) € 1.407.548,48

A2) Oneri per la sicurezza € 62.348,04

A3) per opere in economia € 75.930,59

A) Totale opere di contratto € 1.545.827,11

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto 0,00 €

2) rilievi accertamenti ed indagini 0,00 €

3) allacciamenti a pubblici servizi 0,00 €

4) imprevisti € 10.760,00

5) acquisizione aree o immobili 0,00 €

6) accantonamento 0,00 €

7a) spese tecniche (incarichi esterni) € 170.000,00

7b) spese tecniche (incentivi) € 26.640,00

8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione 0,00 €

9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici 0,00 €

10) spese per pubblicità e opere artistiche € 600,00

11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi € 35.000,00

12) IVA € 340.081,96

13) ribasso d'asta € 304.172,89

14) IVA su ribasso d'asta € 66.918,04

B) Totale somme a disposizione dell'amministrazione comunale € 954.172,89

TOTALE GENERALE A) + B) € 2.500.000,00

### 3. ASSUNTORE DEI LAVORI

Richiamata la determinazione dirigenziale n.1430 del 19/07/2021 con la quale si è stabilito di procedere all'appalto in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato in via transitoria dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e dall'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. n. 77 del 31/05/2021, secondo il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 della L. n. 120/2020.; con Determinazione n. 1784 del 21/09/2021 è stato determinato di aggiudicare l'appalto di cui all'oggetto, per conto del Comune di Venezia a






favore della ditta "COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL,


[REDAZIONE] (vedi oggetto)" - C.I. 14457 - CIG 8844832A42, CUP F78E19000040002", ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. n° 50/2016 con un ribasso offerto del 17,770% sul prezzo a base di gara di €. 1.711.721,37 così per l'importo netto di €. 1.407.548,48 oltre a Oneri per la sicurezza € 62.348,0, per opere in economia €. 75.930,59 e così per l'importo contrattuale di complessivi €. 1.545.827,11

#### 4. DESCRIZIONE DELLE OPERE

I lavori di *Adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio della scuola di primo grado Giulio Cesare di Mestre (VE)*, sono stati suddivisi in due stralci operativi; il primo da eseguirsi nel periodo Giugno – Agosto 2022 nella porzione di edificio denominata "CORPO CENTRALE" e il secondo eseguiti nel periodo Giugno – Agosto 2023 nelle porzioni di edificio denominate "ALI LATERALI" (entrambi oggetto del presente certificato).

Comune di Venezia  
Data: 19/06/2024, PG2024/0295665

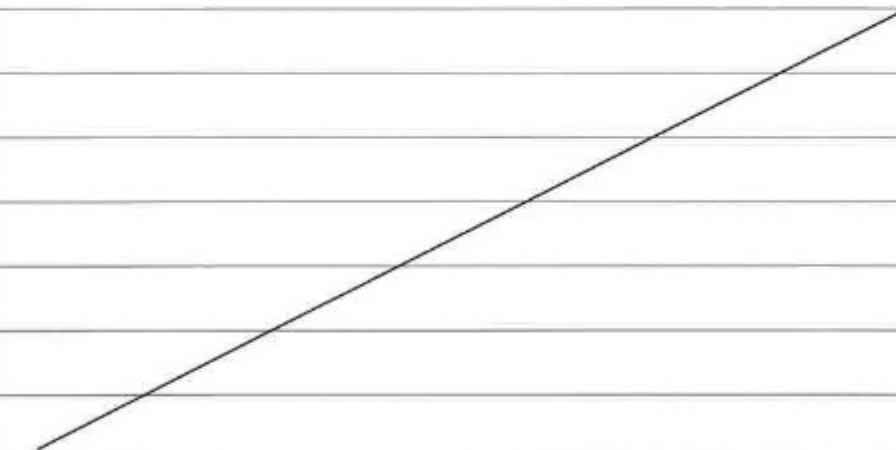

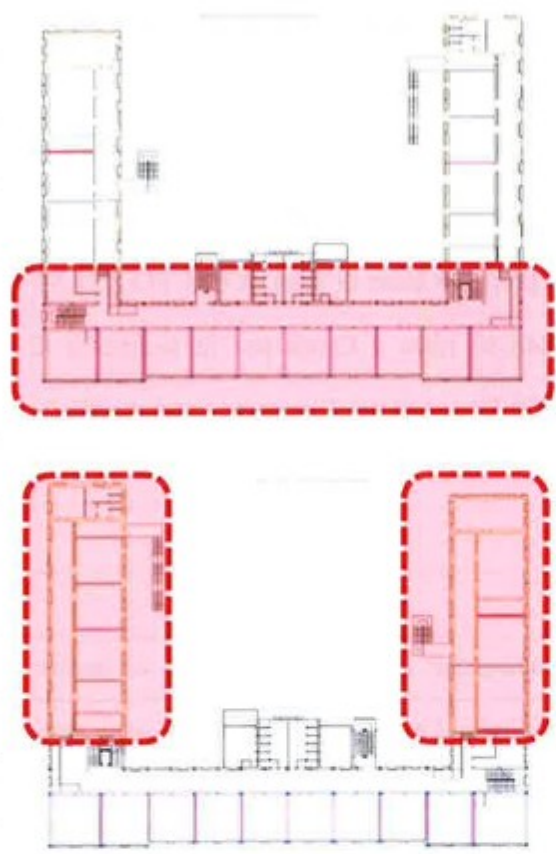

1^ STRALCIO ANNO 2022  
"CORPO CENTRALE"

2^ STRALCIO ANNO 2023  
"ALI LATERALI"

**5. ESECUZIONE OPERE**

Con Ordine di Servizio nr.01, si è approvato il cambiamento della tipologia di intonaco armato, previsto a progetto per le zone del 1^ stralcio 2022 "CORPO CENTRALE", come di seguito descritto:

LAVORAZIONE A PROGETTO:

INTONACO ARMATO (TIPO 1):

- Malta da intonaco 15 MPa (Sp. 3cm);
- Rete FRP 66x66 cm;
- Connettore ad L (nr.6/mq);
- Fazzoletto 33x33cm;

Comune di Venezia  
Data: 19/06/2024, PG/2024/0295665



- Resina.

LAVORAZIONE DISPOSTE CON ORDINE DI SERVIZIO E IN VARIANTE:

INTONACO ARMATO (TIPO 1):

- Mono-intonaco strutturale fibrorinforzato armato con fibre di vetro alcalino "Opificio BioAedilitia - Intonet M15";
- Connettore passante a fiocco in fibra di vetro (nr.2/mq)

Il Direttore dei Lavori riporta ulteriori osservazioni per quanto riguarda le altre lavorazioni previste a progetto:

- il rinforzo a flessione dei pilastri in calcestruzzo è stato eseguito secondo le indicazioni del progetto mediante applicazione di singolo strato di tessuto in fibra di carbonio grammatura 600 gr/mq con connettori in fibra di carbonio a sfiocco doppio;
- è stata regolarmente eseguito l'allargamento del primo giunto sismico presente nel corpo centrale.

Si riportano di seguito le descrizioni dei due OdS.

*Ordine di servizio n° 1 del 20/06/2022*

- esecuzione del consolidamento delle murature di cui alla voce nr.61 - E.40.43.00 con consolidamento realizzato con mono-intonaco strutturale fibro-rinforzato scheda FIBRANTIQUA INTONET M15 completato da connettori passanti a fiocco di vetro FIBRANTIQUA in numero minimo di nr.02/mq (rif. Approvazione scheda SM\_S\_01 a firma Arch. Caccin Lorita del 20/05/2022) sulle sole pareti in muratura piena portante dei piani terra, primo e secondo. Per quanto riguarda le sole pareti divisorie tra le aule poste ai piani primo e secondo, risultate essere realizzate con mattoni forati, si dispone di procedere con rimozione e pulizia degli strati di dipintura*

mediante spazzolatura come da voce nr.28 - P1.20.01, applicazione di primer ULTRAGRIP sugli intonaci cementizi precedentemente raschiati e ripuliti e successiva posa di FIBRANTIQUA INTONET M15 in due fasi di esecuzione con prima fase di spessore 7/8 mm e seconda fase di altrettanti 7/8 mm. Non è prevista la posa da connettori a fiocco per tali murature realizzate in blocchi forati;

ii. realizzazione dei rinforzi dei pilastri si cui alla voce nr.59 – NP12 con variazione della disposizione dei connettori di cui alla voce nr.60 - NP13 da nr.02 passo verticale 50cm a disposizione a “quinconce” passo verticale 25cm per evitare interferenze con le barre di armatura presenti; in corrispondenza dei solai primo e secondo si dispone anche la posa di connettori di cucitura posti a 45° rispetto alla verticale; la posa dei connettori sarà compensata a misura secondo la voce nr.60;

iii. sono state rinvenute su nr. 12 pilastri una serie di tubazioni impiantistiche disposte nel copriferro degli stessi; viene disposto di sezionare gli impianti presenti in accordo con le varie società di manutenzione e di procedere al by-pass degli stessi all'esterno per poter procedere alla ricostruzione del calcestruzzo di copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto già irruvidito come previsto dalla voce nr.56 – NP 09;

iv. ....omissis...

Ordine di servizio n°2 del 27/07/2022

i. eseguire il completamento delle lavorazioni di intonacatura a piano terra sul muro di spina Est – Ovest lato corridoio mediante posa di mono-



intonaco strutturale fibro-rinforzato scheda FIBRANTIQUA INTONET M15

completato da connettori passanti a fiocco di vetro FIBRANTIQUA in numero minimo di nr.02/mq;

ii. mantenere costantemente umidificata la superficie dei soli nuovi intonaci di cui al punto sopra;

iii. procedere alle operazioni di rivestimento, di tutte le superfici interessate dalla lavorazione già realizzata di cui alla voce nr. 61 del CME, con singola lastra in cartongesso posata previa incollatura e successiva tassellatura;

iv. ....omissis.....

Le principali lavorazioni sono state eseguite sui seguenti elementi:

- i. rinforzo muratura portante con intonaco fibrorinforzato e connettori (solo in presenza di muratura piena);
- ii. rinforzo elementi pilastro: cerchiatura con singolo strato di tessuto in fibra di carbonio;
- iii. controventamenti delle ali laterali dell'edificio in muratura di mattoni pieni rinforzata con intonaco armato;
- iv. realizzazione di giunti sismici tra i fabbricati d diversa geometria.

In base alle risultanze del rapporto di prova allegato (SQM\_97\_2021) si è potuto evincere che il risultato, in termini di miglioramento della resistenza a compressione diagonale della muratura rinforzata, è sostanzialmente il medesimo sia nel caso di utilizzo di sistema "tradizionale" (intonaco, rete e connettori) che nel caso di utilizzo di sistema "mono-intonaco fibrorinforzato".

In seguito ad una segnalazione da parte dell'impresa appaltatrice della formazione di una diffusa cavillatura superficiale degli intonaci, difficilmente mascherabile con la rasatura in corso di esecuzione, si è prescritto, con l'Ordine di Servizio nr.02 citato,



l'esecuzione della placcatura con singola lastra di cartongesso di tutte le pareti interessate dal rinforzo con intonaco armato fibrorinforzato.

Il fenomeno sopradescritto è stato ritenuto non influente dal punto di vista strutturale da parte del progettista in quanto trattasi di un tipico quadro fessurativo superficiale generato dal forte gradiente termico giornaliero.

In data 04/05/2023 è stata presentata dalla D.LL. una variante di assestamento isocosto mantenendo inalterato l'importo dei lavori.

Le opere strutturali previste a progetto e realizzate dalla ditta appaltatrice vengono di seguito elencate e descritte:

1) Realizzazione di rinforzo a flessione dei pilastri del corpo centrale mediante applicazione di singolo strato di tessuto in fibra di carbonio grammatura 600 gr/mq con connettori in fibra di carbonio a sfiocco doppio (periodo di esecuzione giugno 2022);

2) Adeguamento dei giunti strutturali esistenti con allargamento sino ad un'ampiezza minima di 4 cm (periodo di esecuzione luglio-agosto 2022 e luglio-agosto 2023);

3) Realizzazione di nr.4 setti murari di controventamento compresa la realizzazione delle relative fondazioni in calcestruzzo armato all'interno delle ali laterali (periodo di esecuzione luglio 2023);

4) Messa in opera di mono-intonaco strutturale fibrorinforzato armato con fibre di vetro alcalino "Opificio BioAedilitia - Intonet M15" su tutte le pareti portanti evidenziate dagli elaborati progettuali a firma dell' [REDACTED] e dalla successiva variante di assestamento del 04/05/2023 a firma della D.LL. (periodo di esecuzione luglio-agosto 2022 e giugno-luglio-agosto 2023);

## 6. VISITE IN CORSO D'OPERA

Sono state svolte le seguenti visite in corso d'opera riguardante l'incarico nel suo complesso in data 22/06/2022, 08/09/2022 e 22/09/2023. Si è altresì presa visione dell'intera documentazione fotografica di cantiere acquisita dalla D.LL..

**7. CAUZIONE DEFINITIVA E RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.**

A garanzia per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, l'Appaltatore ha costituito la prescritta garanzia definitiva mediante polizza assicurativa fidejussoria n. 6001400024 del 28/09/2021 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA a pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto e, ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia per i rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati.

L'Appaltatore ha costituito polizza assicurativa CAR per danni di esecuzione n. 07940 11 48527818 rilasciata dalla compagnia HELVETIA.

Dette garanzie rispondono ai requisiti di legge e di contratto.

**8. ANDAMENTO: CONSEGNA, TEMPO UTILE, SOSPENSIONI E PROROGHE.**

I lavori di Contratto sono stati suddivisi in due stralci denominati "step1 lavori anno 2022" e "step 2 lavori anno 2023". I lavori dello step 1 furono consegnati in forma parziale con Verbale redatto il giorno 16/05/2022 ed in forma definitiva con Verbale redatto il giorno 18/06/2022 e sospesi con Verbale redatto il giorno 01/09/2022. I lavori relativi allo step 2 furono consegnati in forma parziale con Verbale redatto il giorno 05/06/2023 ed in forma definitiva con Verbale redatto il giorno 17/06/2023 e completati con Verbale redatto in data 08/09/2023.



Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. 18 del **Capitolato Speciale** d'Appalto e dall'art. 5 del contratto 75+75=150 giorni naturali e consecutivi (come da offerta tecnica presentata dalla ditta appaltatrice) a partire dai Verbali di Consegna dei lavori previsti in n. 2 annualità, 2022 e 2023, nei mesi estivi, con sospensione nel periodo scolastico di utilizzo del plesso.

A seguito della istanza di proroga della ditta aggiudicataria, prot. n.409913 del 31/08/2023 con la quale chiedeva una proroga di 10 giorni sulla data di ultimazione dei lavori, prevista per il giorno 31/08/2023, per il verificarsi di periodi persistenti di particolari condizioni climatologiche nei mesi estivi che hanno rallentato l'esecuzione dei lavori; vista la richiesta di considerazioni inviata al Direttore Lavori in data 31/08/2023, prot. n. 410293 sull'accogliibilità della richiesta di proroga, la stazione appaltante, in data 04/09/2023, ha concesso una proroga alla ditta appaltatrice di nr.8 giorni modificando la data di completamento dei lavori contrattualmente fissata dal 31/08/2023 al 08/09/2023, senza nessuna variazione di spesa rispetto a quanto indicato nella Determina Dirigenziale n.1784 del 21/09/2021.

**Detta proroga risulta giustificata e coerente con la norma.**

L'impresa "COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL" con propria comunicazione in data 08/09/2023 ha reso noto di avere ultimati i lavori in data 08/09/2023. Il giorno 08/09/2023 veniva redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori, constatando che gli stessi erano stati ultimati, nel rispetto dei tempi previsti nel crono-programma e delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo.

## **9. PERIZIE DI VARIANTE E NUOVI PREZZI.**

La D.LL. ha proceduto a redigere una perizia di variante per la redistribuzione dei lavori previsti a seguito della corrispondenza tra gli uffici competenti del Comune di



Venezia e della Regione Veneto di seguito riportata:

- Comunicazione trasmessa dalla Regione Veneto, nota registrata al protocollo regionale n. 542185 del 18/11/2021, con presa d'atto della comunicazione di avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Venezia determina dirigenziale n. 1430 del 19/07/2021 nota n.340955 del 22/07/2021;
- Comunicazione trasmessa dalla Regione Veneto con oggetto "chiarimenti alla presa d'atto progetto esecutivo (nota protocollo regionale n. 542185 del 18/11/2021)" con nota n. 30142 del 21/01/2022 a chiarimento che le spese ammesse e rendicontabili saranno solo ed esclusivamente quelle relative all'edificio scuola (cod. MIUR 0270423542) e non all'edificio palestra (cod. MIUR 0270423543);
- comunicazione trasmessa dal Comune di Venezia, nota 118278 del 16/03/2022 registrata al prot. Reg. n. 120678 del 16/03/2022 e relativa risposta della Regione Veneto – Prot. Reg. 193370 del 19/04/2022 – PG Comune Venezia 189689/2022 del 29/04/2022, in merito all'utilizzo dell'importo di finanziamento per lavori da destinarsi esclusivamente al corpo scuola (cod. MIUR 0270423542) e pertanto ad esclusione del corpo palestra (cod. MIUR 0270423543) è stato concesso dalla Regione l'utilizzo delle somme destinate al corpo palestra, non oggetto di finanziamento, "per realizzare opere aggiuntive sull'edificio scuola [...] ritenute utili a seguito di sopralluoghi effettuati da parte della DD.LL." nell'approssimarsi dell'inizio lavori del I° step.

La perizia di variante risulta coerente con i requisiti di legge e redatta secondo gli stessi.

Per l'esecuzione dei lavori di appalto e di perizia si è reso necessario redigere due verbali di nuovi prezzi:

- Verbale di concordamento n.1 in data 03/08/2022;

- Verbale di concordamento n.2 in data 08/08/2023;

Detta perizia non ha comportato aumento dei costi.

#### **10. SUBAPPALTI.**

L'impresa durante il corso dei lavori ha presentato richiesta di autorizzazione al subappalto, che risultano regolarmente autorizzati:

- [REDACTED] Srl, contratto sub appalto €. 48.000,00 cat. OS21, autorizzazione del RUP n.375561 del 23/08/2022;
- [REDACTED] contratto sub appalto €. 28.900,00 cat. OG01, autorizzazione del RUP n.300114 del 05/07/2022 e successiva integrazione €. 95.526,07 cat. OG01, autorizzazione del RUP n.382094 del 08/08/2023;
- [REDACTED] contratto sub appalto €. 7.900,00 cat. OG01, autorizzazione del RUP n.402032 del 25/08/2023

#### **11. ORDINI DI SERVIZIO.**

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati impartiti all'Impresa Ordini di Servizio, nel dettaglio:

- Ordine di Servizio n.01 in data 20/06/2022, per cambiamento tipologia intonaco armato;
- Ordine di Servizio n. 02 in data 27/07/2022, per placcaggio superfici soggette ad intonaco armato,

Si rimanda al paragrafo 5 per i dettagli.

#### **12. DANNI DI FORZA MAGGIORE.**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni dovuti a forza maggiore,

giusta dichiarazione del D.L. in sede di relazione sul conto finale.

### **13. ANTICIPAZIONI IN DENARO.**

In corso di esecuzione dei lavori, in applicazione dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, ed all'art. 12 del contratto d'appalto, venne erogata all'appaltatore in data 16/06/2022, a titolo di anticipazione la somma di €. 463.748,13 oltre all'IVA di legge, corrispondente al 30% dell'importo del contratto, con emissione di polizza assicurativa n.1876668 in data 26/05/2022 rilasciata da EL.BA ASSICURAZIONI SPA.

### **14. CERTIFICATI DI ACCONTO.**

Durante il corso dei lavori vennero emessi i seguenti certificati di pagamento:

- Anticipazione senza applicazione di trattenuta e quindi corrispondente al certificato di pagamento nr.01 di €. 463.748,13 o.f.e del 16/06/2022;
- SAL 1: €. 810.038,43 corrispondente al certificato di pagamento nr.02 di €. 562.976,71 o.f.e del 28/09/2022;
- SAL 2: €. 1.066.551,56 corrispondente al certificato di pagamento nr.03 di €. 178.276,62 o.f.e del 27/05/2023;
- SAL 3: €. 1.470.870,26 corrispondente al certificato di pagamento nr.04 di €. 281.001,50 o.f.e dell'11/10/2023;
- **Lo stato finale** è stato redatto in data 08/09/2023 con importo complessivo netto di €. 1.540.089,51 all'interno dell'importo contrattuale con una economia di €. 5.737,60 sull'importo contrattuale. Lo stato finale risulta così composto:
  - a) esecuzione delle sole lavorazioni al netto del ribasso del 17.770%: lavori netti €. 1.344.737,35
  - b) lavori in economia: €. 126.188,32



c) oneri per la sicurezza: € 69.163,84

totale a+b+c: € 1.540.089,51

da cui dedotti:

d) per anticipazione 30% importo di contratto: € 463.748,13

e) per certificati di acconto già emessi: € 1.022.254,83

secondo il detto stato finale resta quindi il credito netto all'impresa in: conto finale € 54.086,55.

### **15. LAVORI IN ECONOMIA**

In corso di esecuzione sono stati eseguiti lavori in economia, così come indicati nelle apposite liste quindicinali relativo allo stato finale dei lavori; detta verifica è stata condotta dal Direttore dei Lavori.

### **16. ADEGUAMENTO PREZZI, AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022**

Con determinazione dirigenziale n. 1035 del 03/05/2023 veniva approvato l'adeguamento prezzi del SAL n. 1 previa accettazione da parte della ditta appaltatrice:

- SAL API: € 39.322,30 corrispondente ad un certificato di pagamento di € 39.125,69 o.f.e. del 30/05/2023;

con determinazione dirigenziale n. 410 del 06/03/2024 veniva impegnata la spesa necessaria per il riconoscimento dell'adeguamento prezzi dei SAL 2, 3 e 4/conto finale, i cui importi definiti dalla D.LL. erano stati preventivamente accettati dall'appaltatore in data 02/02/2024 con nota n. prot. 58933 secondo i seguenti importi:

- SAL AP2: € 20.976,94 corrispondente ad un certificato di pagamento di € 20.872,06 o.f.e. del 18/03/2024;





- SAL AP3: € 34.474,42 corrispondente ad un certificato di pagamento di € 34.304,04 o.f.c. del 18/03/2024;
- SAL AP4/conto finale: € 3.023,84 corrispondente ad un saldo di € 3.497,71 ( in quanto vengono svincolate le trattenute dello 0,5% fatte sui certificati di pagamento AP 1, 2 e 3).

Per il pagamento dell' AP del SAL 4/conto finale l'A.C. resterà in attesa del collaudo tecnico amministrativo.

Per l'adeguamento prezzi si è provveduto alla copertura con risorse dell'Amministrazione. Al riguardo con Deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 14/07/2022 "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2022. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025" è stato previsto un ulteriore stanziamento dell'importo di € 126.270,00 (o.f.c.), spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato da contributi Legge Speciale applicata a Bilancio 2022 e pertanto con DD n. 2664 del 19.12.2022 il Quadro economico è stato rimodulato con contestuale incremento alla voce "Imprevisti" delle somme a disposizione, per assicurare il pagamento del caro materiale, secondo le disposizioni normative, ad ogni singolo SAL

#### 17. **CREDITO FINALE A FAVORE DELL'IMPRESA:**

- Saldo della contabilità derivante da contratto originale € 54.086,55;
- Saldo sull'adeguamento prezzi del conto finale € 3.497,71;
- per un totale a favore dell'impresa di € 57.584,26.



**18. CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA**

Complessivamente l'importo al netto (di iva) dei lavori eseguiti e contabilizzati risultante dallo stato finale risulta coerente con le somme autorizzate e stanziare dall'Amministrazione, con una economia come da par. 14 – Stato finale – del presente certificato di collaudo t-a.

**19. RISERVE DELL'IMPRESA**

L'impresa aggiudicataria ha firmato il Registro di Contabilità e il Conto Finale senza riserva alcuna per la richiesta di maggiori compensi.

**20. ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI**

L'impresa "COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL " ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con polizza assicurativa INAIL sede di Roma, CODICE DITTA 5337071 PAT. N. 93108152/95.

**21. INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni, come dichiarato dalla Direzione Lavori in sede di relazione sul conto finale.

**22. ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI**

La stazione appaltante ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore dal quale si evince a tutt'oggi la posizione regolare (ultima verifica DURC con validità fino al 03/06/2024).

Comune di Venezia  
Data: 19/06/2024, P.G.2024/0295665

**23. AVVISO AI CREDITORI**

Il RUP ha prodotto avviso ai creditori in data 25/09/2023 PG 453061 che è stato pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del 25/09/2023 al 24/11/2023.

Con nota del 29/05/2024 il R.U.P. ha comunicato al Collaudatore l'inesistenza di comunicazioni di soggetti vantanti crediti,

**24. CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA**

Non risulta che l'appaltatore abbia fatto cessione di crediti per i lavori in oggetto.

**25. ANDAMENTO DEI LAVORI**

Dagli atti risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, della perizia di variante e in conformità agli ordini e alle disposizioni della Direzione Lavori, giusta dichiarazione del D.LL. con la sottoscrizione della relazione sul Conto Finale e verifica per quanto possibile del sottoscritto Collaudatore.

**26. CERTIFICATI DI COLLAUDO STATICO**

E' stato emesso un primo certificato di collaudo statico in data 01/02/2023 e successivamente, in data 02/12/2023, con l'ultimazione della seconda fase è stato emesso il secondo certificato di collaudo statico che ha inglobato anche il precedente.

**27. COLLAUDABILITA' DELL'OPERA**

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- a) i lavori vennero eseguiti secondo il progetto e alla regola dell'arte;



- b) il valore contabilizzato è coerente con la spesa assunta dall'Amministrazione;
- c) la stazione appaltante ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della ditta appaltatrice, dal quale si evince la regolarità contributiva;
- d) i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- f) i prezzi indicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- g) non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure o deleghe a favore di terzi;
- i) l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;
- l) i lavori sono stati diretti con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei Lavori;
- è stato acquisito il certificato di collaudo statico;
- m) l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
- n) non vi sono crediti vantati da terzi;
- o) che le condizioni generali delle opere eseguite si presentano in normale stato di conservazione dalla loro ultimazione;
- p) che i lavori sono stati eseguiti in tempo utile rispetto agli accordi contrattuali intervenuti;
- q) che non risultano notificati atti impeditivi o cessioni di credito a danno dell'Impresa;
- r) PNRR: trattandosi di progetti cosiddetti "in essere" la committenza ha rispettato per quanto possibile le specifiche disposizioni previsti per questa tipologia di interventi;

RITENUTO





I. che per quanto è stato possibile verificare, lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

II. che per quanto non è ora possibile verificare la Direzione dei Lavori ha riportato nella relazione sul conto finale che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle specifiche disposizioni date all'atto pratico;

III. che, come è stato precedentemente specificato, i lavori risultano essere stati eseguiti a buona regola in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Il sottoscritto Collaudatore

**CERTIFICA**

che i lavori di "Scuola secondaria di primo grado Giulio Cesare. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio (finanziamento regionale D.G.R. N. 511/2018) -1° e 2° Stralcio"

**SONO COLLAUDABILI**

come in effetti con il presente atto li collauda e

**LIQUIDA**

a favore dell'impresa l'importo di €. 57 584,26 costituiti da:

- Saldo della contabilità derivante da contratto originale €. 54.086,55;
- Saldo sull'adeguamento prezzi del conto finale €. 3.497,71;

Venezia, 06/06/2024

Impresa esecutrice Pasqualucci S.r.l. :

Firmato digitalmente da

Il Direttore dei Lavori:



Il Responsabile Unico del Procedimento: dott. Aldo Menegazzi

Firmato digitalmente da: ALDO  
MENECAZZI  
Data: 18/06/2024 15:48:10

Il Collaudatore Tecnico-Amministrativo



*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.*

Comune di Venezia  
Data: 19/06/2024, PG2024/0295665

